


第24回豊丘村リニア対策委員会

令和3年10月8日(金) 19:00～

於:豊丘村保健センター2F



東海旅客鉄道株式会社

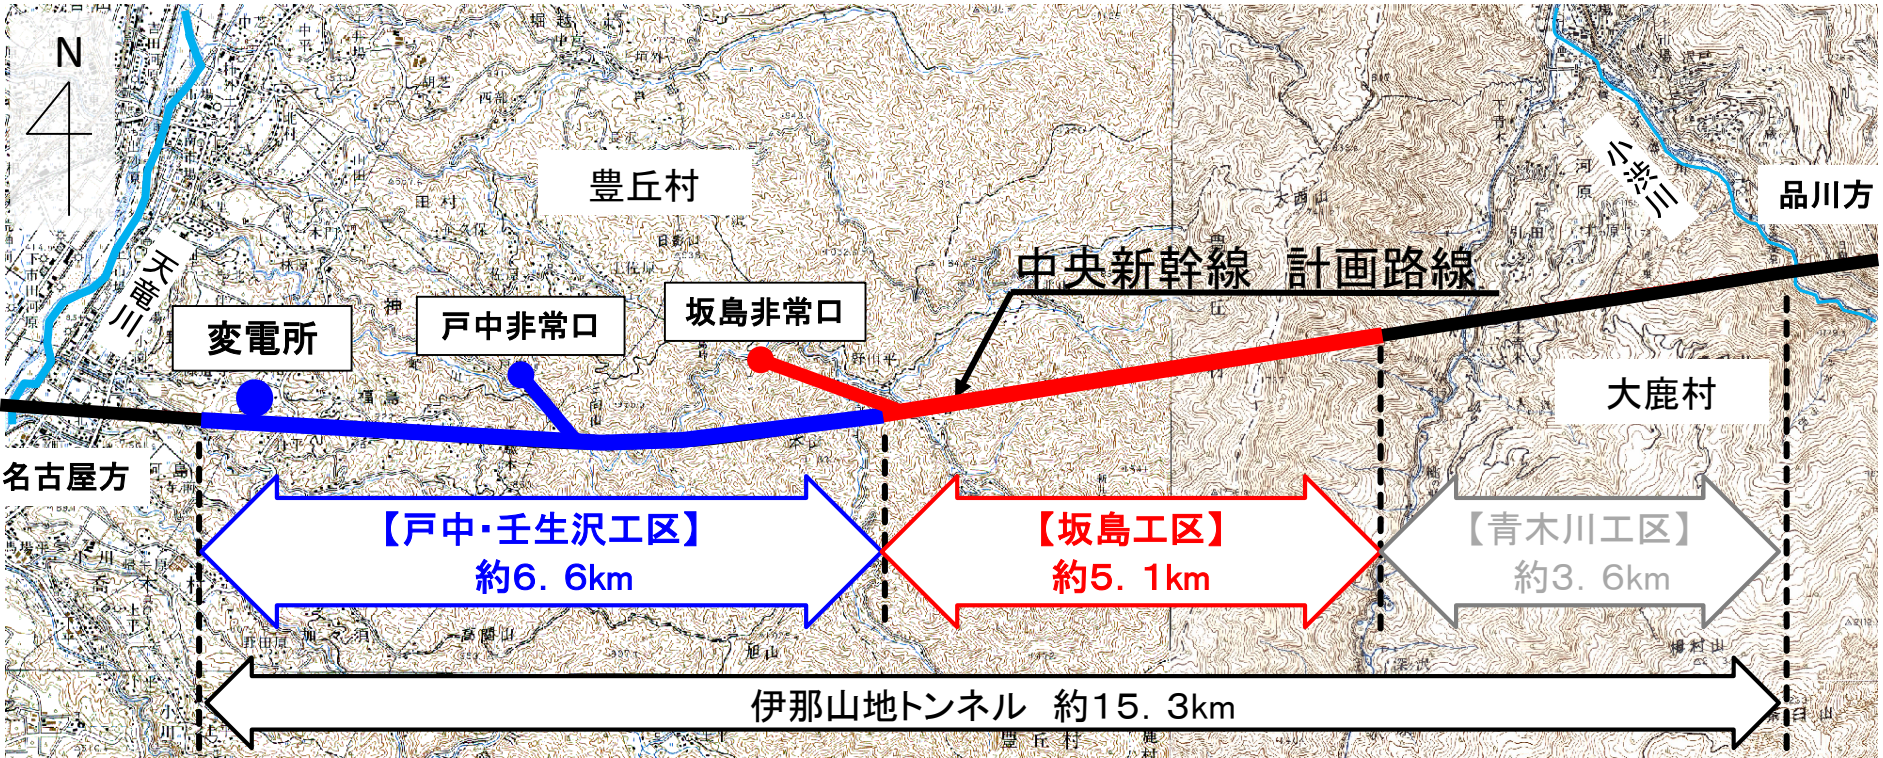

工事名称：『中央新幹線伊那山地トンネル新設
(戸中・壬生沢工区)』


『中央新幹線伊那山地トンネル新設(坂島工区)』

請負会社：飛島建設(株)、(株)市川工務店工事共同企業体

清水建設(株)、大日本土木(株)工事共同企業体

契約工期：2018年9月6日 より 2026年9月30日

2016年9月29日 より 2026年9月30日

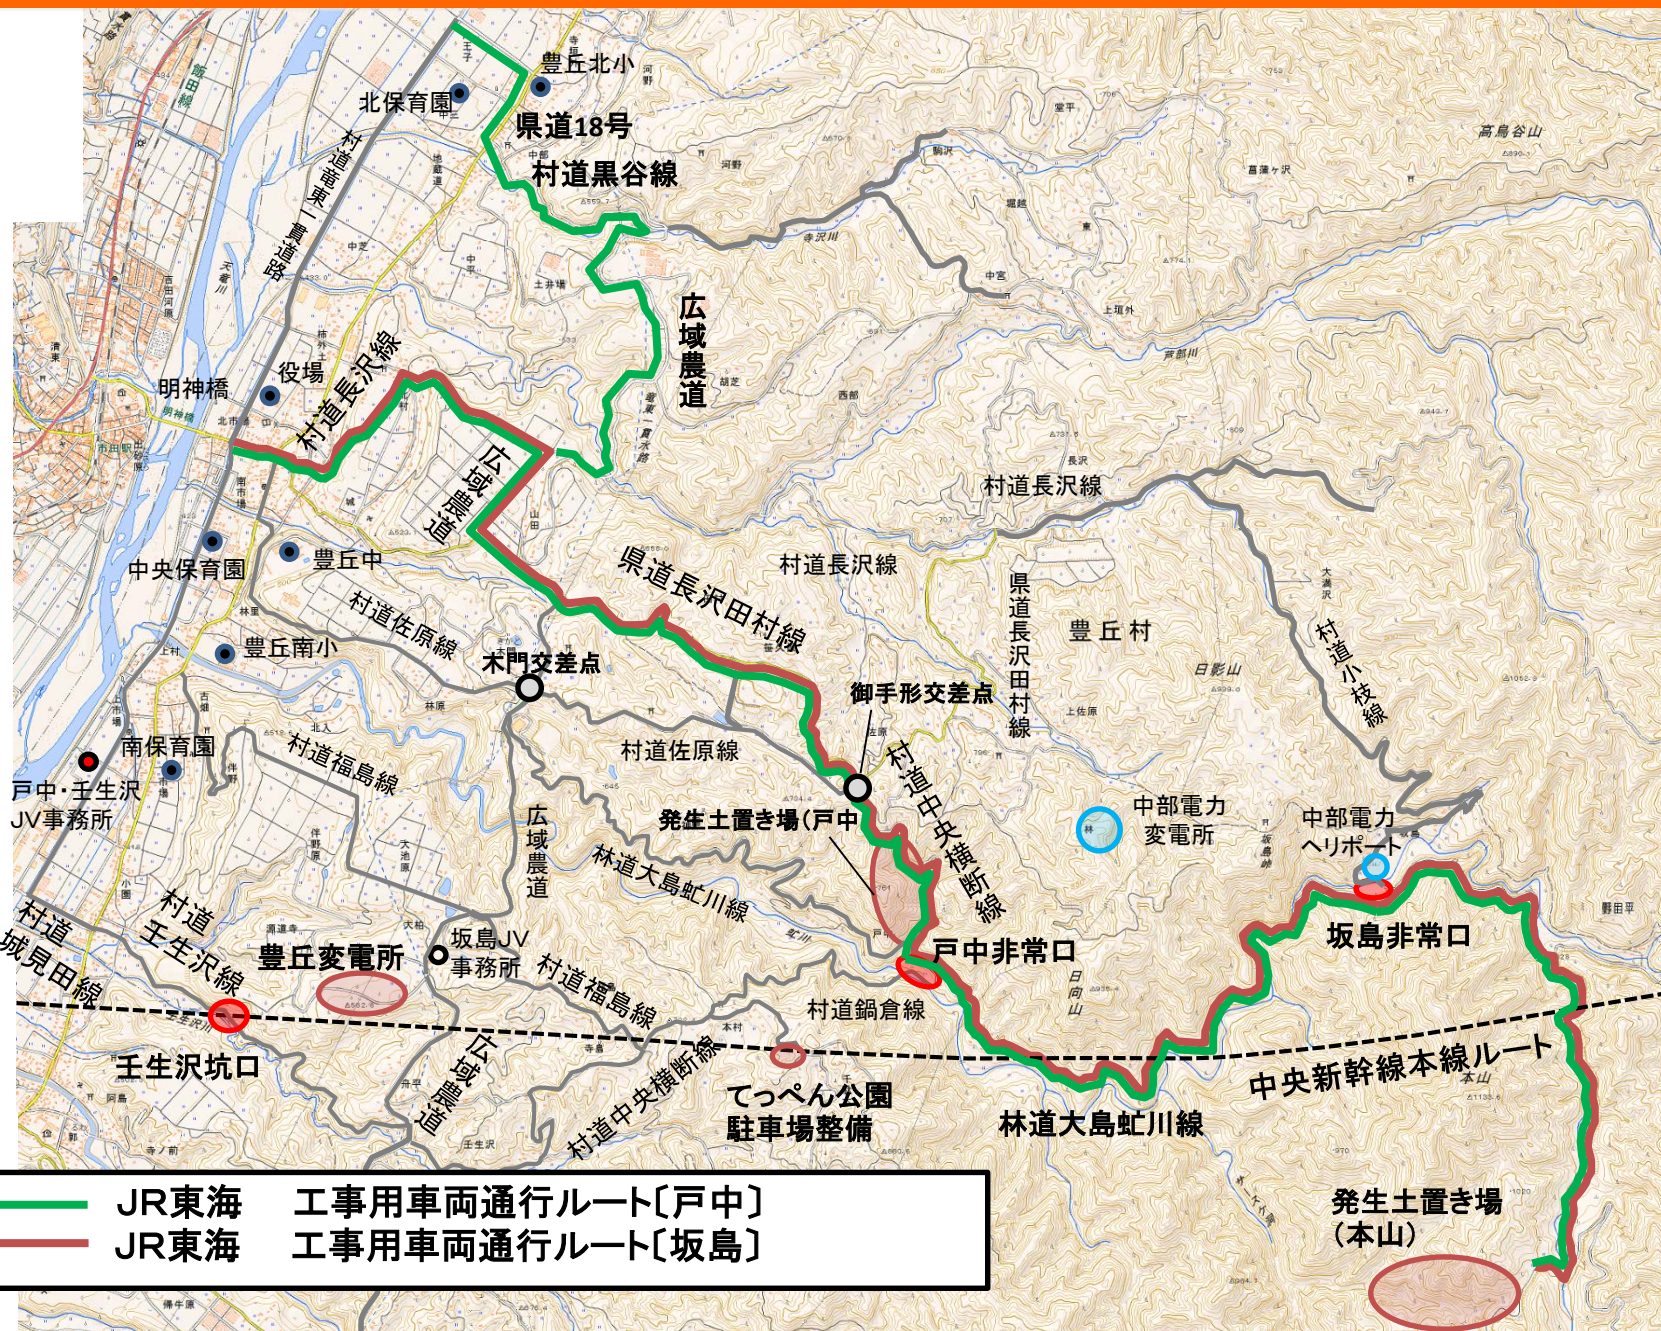


- ・坑外設備等の整備が完了し、7月16日から斜坑掘削を開始しました。延長約1,440mのうち、約1割の掘削が完了しております。
- ・掘削した発生土のうち、掘削3日分について自然由来重金属等の溶出試験の結果、「ヒ素」の項目で基準値を上回る結果が確認されました。
- ・基準値を上回った発生土については、事前に計画していた坂島非常口付近の発生土仮置き場(坂島)に運搬し、適切に盛土しています。

坂島斜坑 施工状況(9月15日)




坂島非常口ヤード



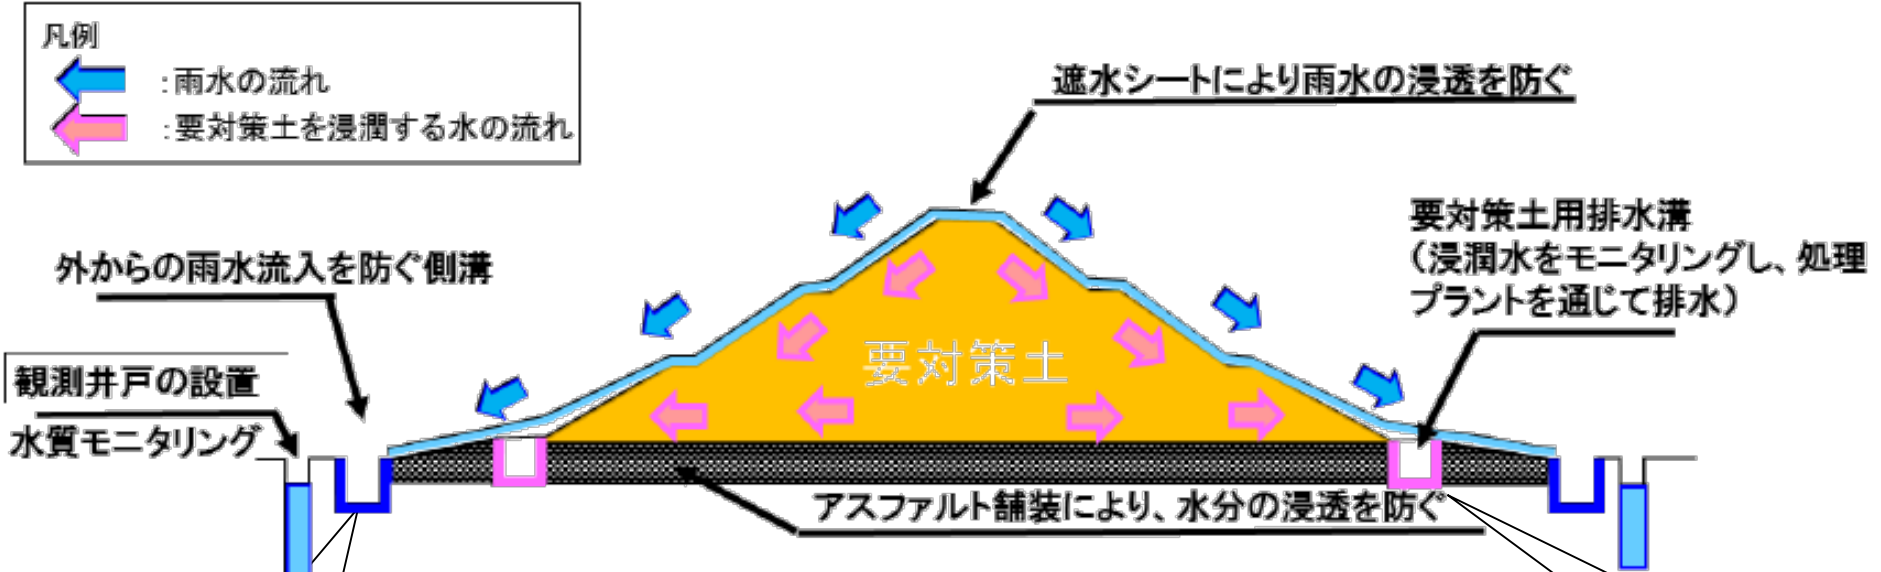

図：要対策土仮置き場における盛土計画




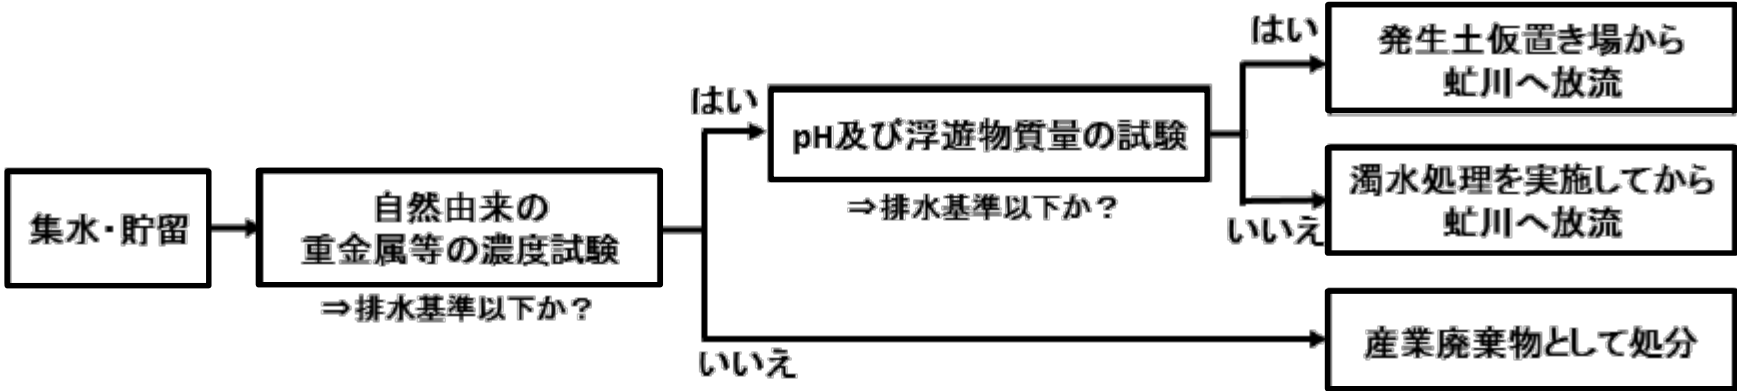

図：排水処理のフロー



発生土置き場(本山)

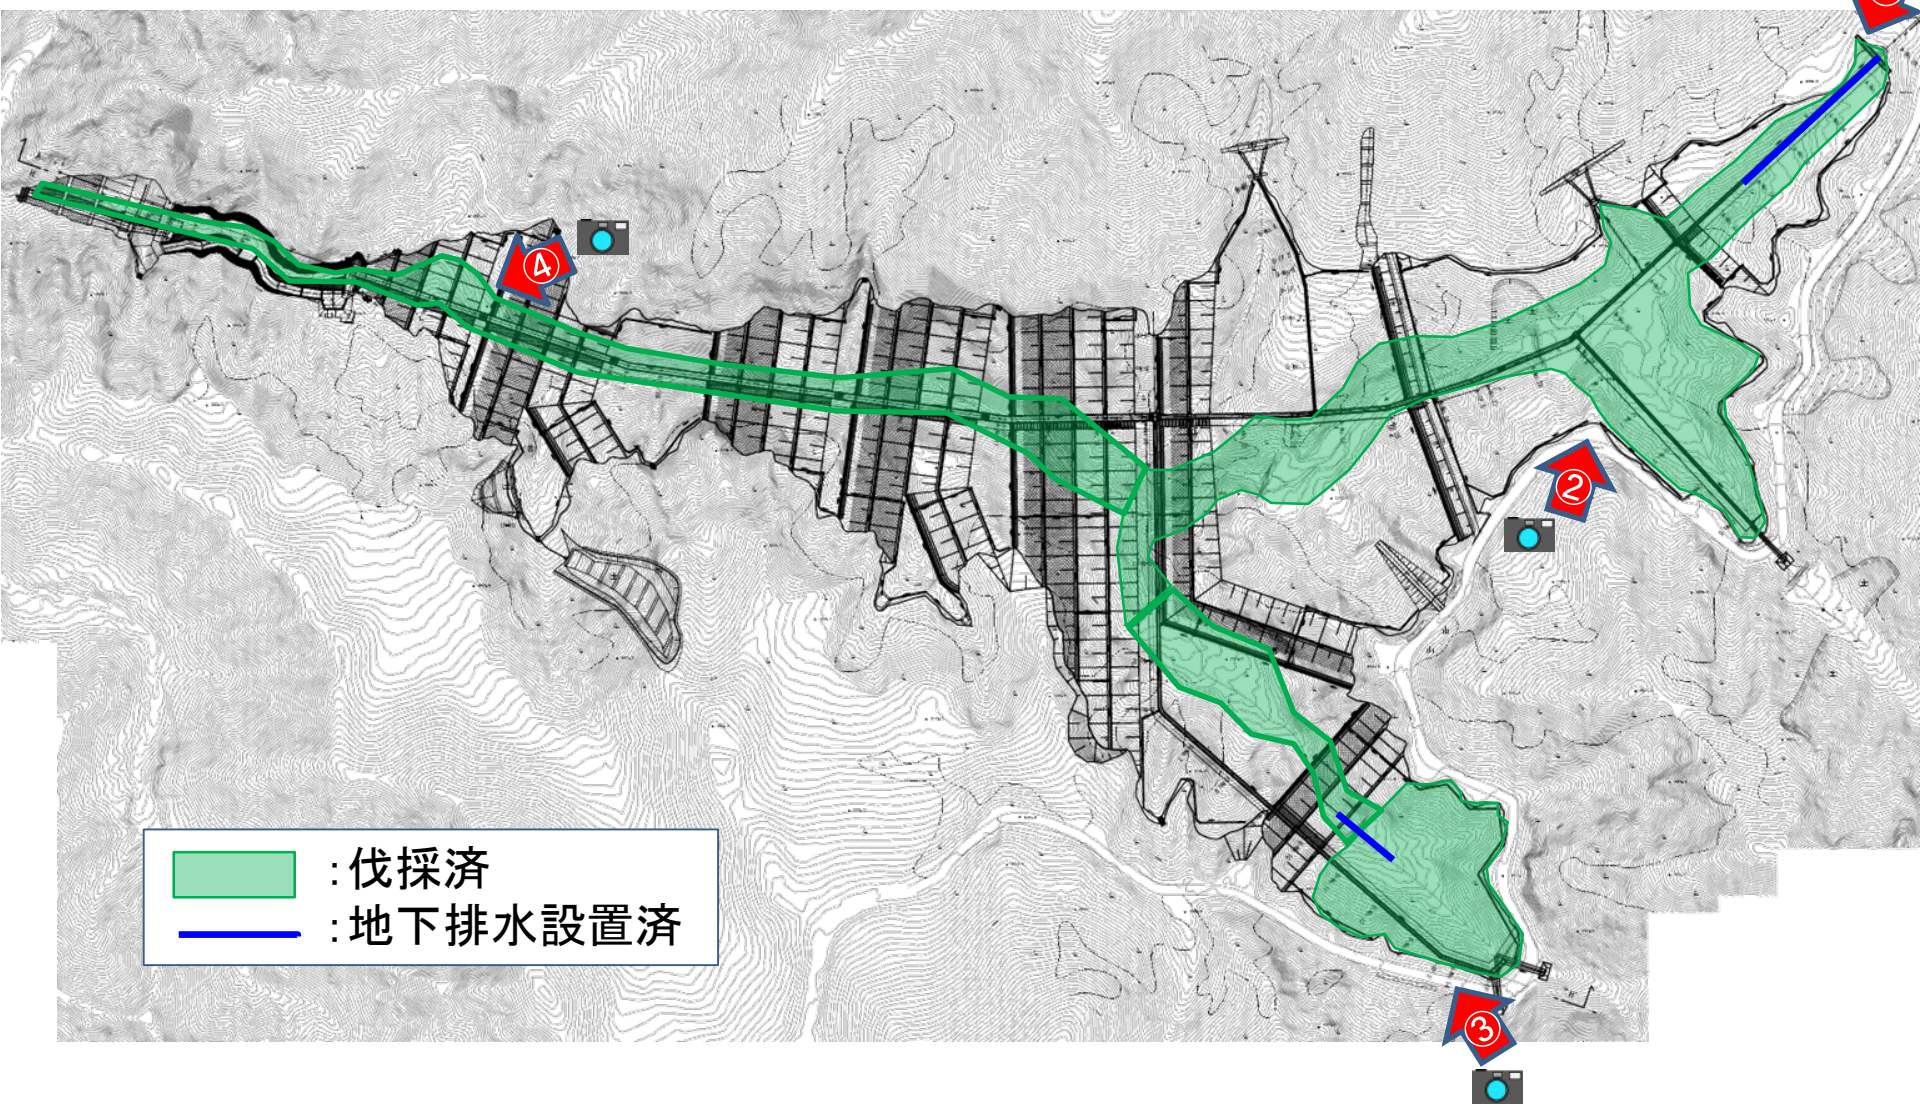

①パイロット道路の造成状況



②パイロット道路の造成状況



③地下排水管の敷設状況



④仮設沈砂池設置状況



本日の対策委員会





主な作業箇所	9月	10月	11月
坂島非常口ヤード (斜坑掘削)			
発生土置き場(本山) (伐採、パイロット道路造成、 地下排水、造成等)			
発生土仮置き場(坂島) (発生土仮置き)			

※工程は現時点の予定です。

- ・坑外設備等の整備が完了し、6月28日から斜坑掘削を開始しました。
延長約980mのうち、約1割の掘削が完了しております。



発生土置き場(戸中)

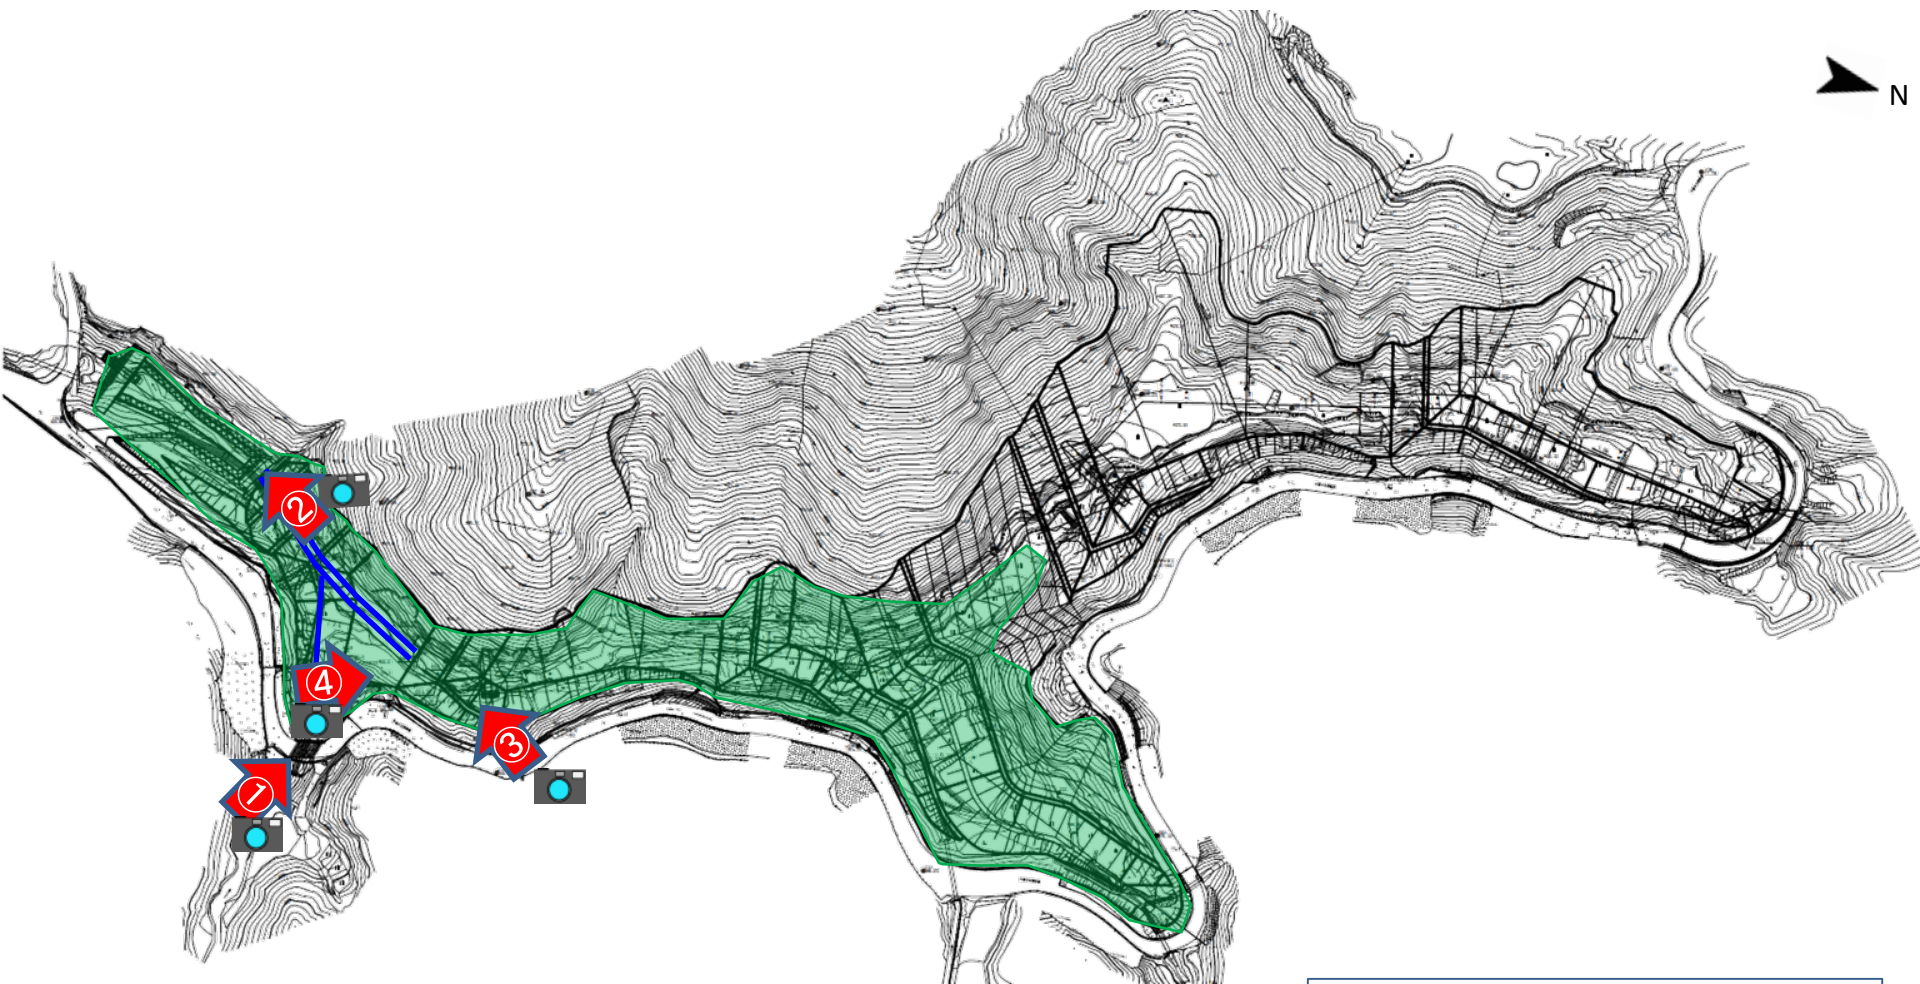

①土砂ピット周辺状況



②調整池設置状況



③埋設工設置状況



④集水井設置状況



村道黒谷線



完了

御手形交差点



施工中

木門交差点




施工中

本日の対策委員会



主な作業箇所	9月	10月	11月
戸中非常口ヤード (斜坑掘削)			
発生土置き場(戸中) (調整池・地下排水・造成等)			
道路改良 (木門交差点等)			

※工程は現時点の予定です。

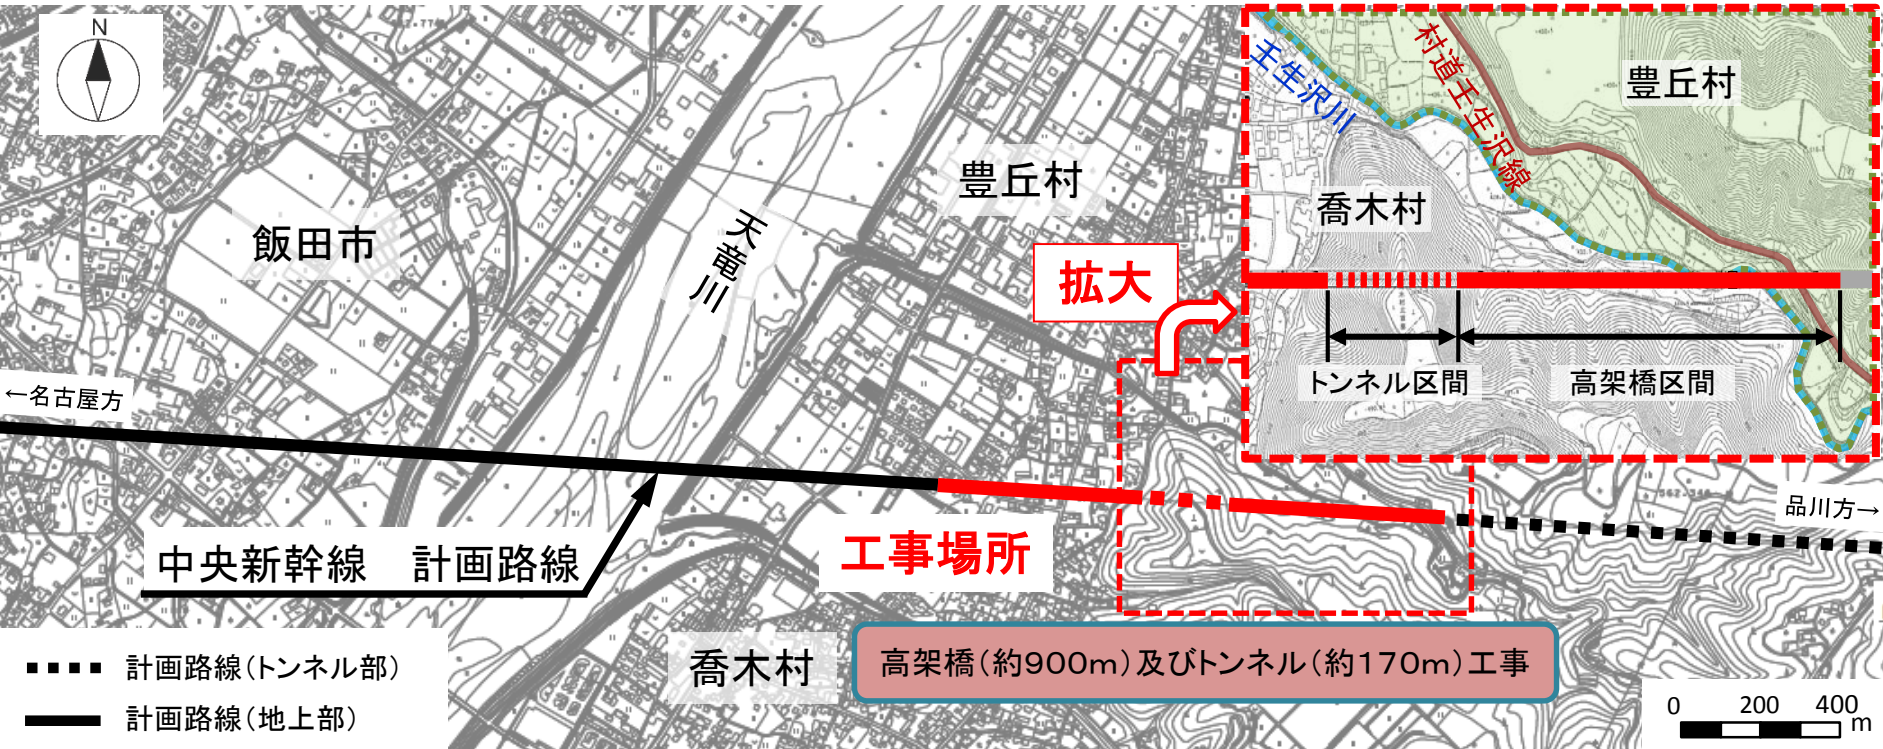

工 事 名	中央新幹線阿島北高架橋ほか新設
請 負 業 者	中央新幹線阿島北高架橋ほか新設 工事共同企業体（飛島建設株式会社・神稻建設株式会社）
工 事 場 所	長野県下伊那郡豊丘村、長野県下伊那郡喬木村
契 約 締 結 日	2021年4月21日
工 期	2026年4月22日から2026年3月31日まで

JR東海	東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所（電話）0265-38-6500 環境保全事務所（長野）（電話）0265-52-6511 （住所）長野県飯田市元町5451
伊那山地（坂島工区） 清水建設・大日本土木JV	中央新幹線伊那山地トンネル新設（坂島工区）工事共同企業体事務所 （住所）長野県下伊那郡豊丘村神稲9440-1 （電話）0265-49-8416
伊那山地（戸中・ 壬生沢工区） 飛島建設・市川工務店JV	中央新幹線伊那山地トンネル新設（戸中・壬生沢工区）工事共同企業体事務所 （住所）長野県下伊那郡豊丘村神稲9105-1 （電話）0265-49-0502
阿島北工区 飛島建設・神稲建設JV	中央新幹線阿島北高架橋ほか新設工事共同企業体事務所 （住所）長野県飯田市元町5430-1 第二吉川ビル 2F B号室 （電話）0265-49-8314

※ 受付：土・日・祝日・年末年始を除く平日 9時～17時
